




# สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของจังหวัดน่าน



โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

**สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานขับเคลื่อน  
การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของจังหวัดน่าน**

|                                  |    |      |
|----------------------------------|----|------|
| ติดตั้งแล้วเสร็จ                 | 3  | แห่ง |
| ยังไม่ดำเนินการ                  | 0  | แห่ง |
| อยู่ระหว่างดำเนินการ             | 25 | แห่ง |
| มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถติดตั้งได้ | 5  | แห่ง |

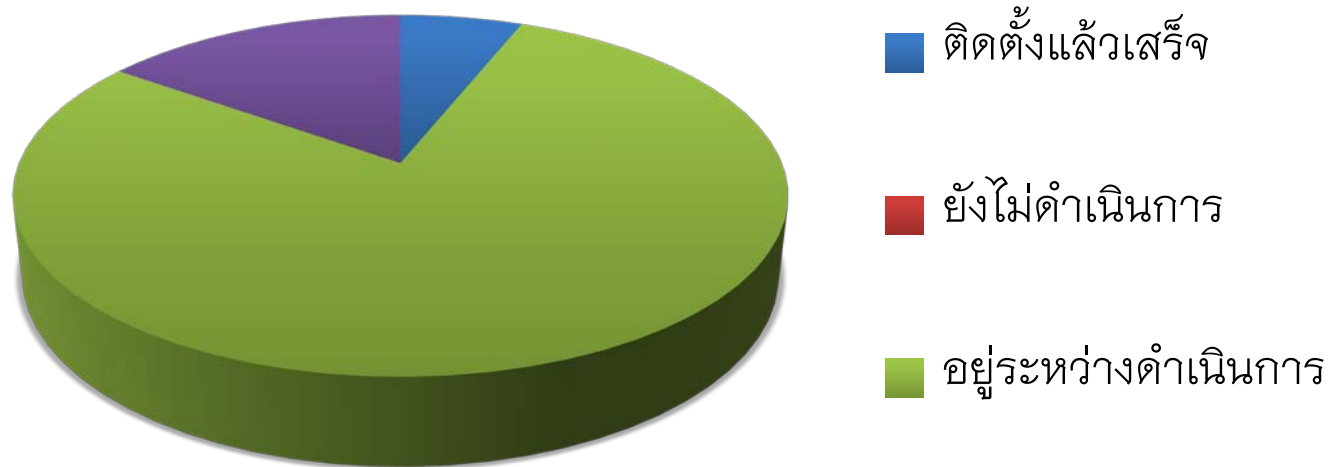

# รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

| หน่วยงาน                        | กำลังการผลิตติดตั้ง (kW) | แผนการดำเนินงาน                            |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน    | 40 kW                    | พิจารณาผลการประกวดราคา                     |
| สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 15 อำเภอ | 3 kW                     | พิจารณาผลการประกวดราคา                     |
| โรงพยาบาลน่าน                   | 112 kW                   | ติดตั้งแล้วเสร็จ ติดตั้งปี งบประมาณปี 2565 |
|                                 | 824 kW                   | รออนุมัติจาก กกพ.                          |
| โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว     | 160 kW                   | ติดตั้งปี งบประมาณปี 2563                  |
|                                 | 175 kW                   | รออนุมัติจาก กกพ.                          |

# รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

| หน่วยงาน                     | กำลังการผลิตติดตั้ง(kW) | แผนการดำเนินงาน                                                                                              |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โรงพยาบาล<br>เฉลิมพระเกียรติ | 80 kW                   | รออนุมัติจาก กกพ.                                                                                            |
| โรงพยาบาลเชียงใหม่           | 65 kW                   | รออนุมัติจาก กกพ.                                                                                            |
| โรงพยาบาลท่าวังผา            | 100 kW                  | รออุทธรณ์ 7 วัน ถึง 29 ส.ค.2566 /ทำสัญญาภายใน 7 วัน (30-7 ก.ย.2566)และได้รับการจัดสรรเงิน วันที่ 29 ส.ค.2566 |
| โรงพยาบาลทุ่งช้าง            | 20 kW                   | อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง                                                                                  |
| โรงพยาบาลบ้านหลวง            | 20 kW                   | กำลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                 |
| โรงพยาบาลสองแคว              | 100 kW                  | รออนุมัติจาก กกพ.                                                                                            |
| โรงพยาบาลภูเพียง             | 20 kW                   | ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ รอส่งมอบ                                                                           |

# รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

| หน่วยงาน          | กำลังการผลิตติดตั้ง(kW) | แผนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โรงพยาบาลเวียงสา  | 20 kW                   | ขอชะลอการติดตั้งปี 2566 ไปเป็น 2567 เนื่องจากสถานการณ์ทางการเงินบารุงไม่เพียงพอ สำหรับบริหารจัดการในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 และขึ้นไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 และ ปัญหาอาคารที่ไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้ เนื่องจากหลังคาเก่า อายุมากกว่า 25 ปี |
| โรงพยาบาลนาหมื่น  | 20 kW                   | ขอชะลอการติดตั้งปี 2566 ไปเป็น 2567 เนื่องจากสถานการณ์ทางการเงินบารุงไม่เพียงพอ สำหรับบริหารจัดการในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 และขึ้นไตรมาสที่ 1 ของปี 2567                                                                                  |
| โรงพยาบาลบ่อเกลือ | 20 kW                   | ขอชะลอการติดตั้งปี 2566 ไปเป็น 2567 เนื่องจากสถานการณ์ทางการเงินบารุงไม่เพียงพอ สำหรับบริหารจัดการในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 และขึ้นไตรมาสที่ 1 ของปี 2567                                                                                  |
| โรงพยาบาลแม่จริม  | 55 kW                   | ขอชะลอการติดตั้งปี 2566 ไปเป็นปี 2567 เนื่องจากสถานการณ์ทางการเงินบารุงไม่เพียงพอ สำหรับบริหารจัดการในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 และขึ้นไตรมาสที่ 1 ของปี 2567                                                                                |
| โรงพยาบาลสันติสุข | 20 kW                   | ขอชะลอการติดตั้งปี 2566 เนื่องจากสถานการณ์ทางการเงินบารุงไม่เพียงพอ สำหรับบริหารจัดการในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 และขึ้นไตรมาสที่ 1 ของปี 2567                                                                                              |
