



รายงานความก้าวหน้า รายการงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

ข้อมูล ณ 5 มีนาคม 2568

งบลงทุน พรบ.รายจ่าย พ.ศ.2568 ที่ได้รับจัดสรรฯ

ครุภัณฑ์

หน่วยรับงบฯ	รายการ	หน่วย	วงเงินตามสัญญา	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ PO+เบิกจ่าย
สสจ.น่าน	23	23	26,747,000	11,091,000	249,000	42.40
รพ.น่าน	6	6	17,400,000	3,595,000	13,697,500	99.38
รวม	29	29	44,147,000	14,686,000	13,946,500	64.86

ก่อสร้าง

หน่วยรับงบฯ	รายการ	วงเงินตามสัญญา	ปี 68	ปี 69	ความก้าวหน้า
รพ.น่าน	1	166,269,600	33,254,000	133,015,600	อยู่ระหว่างประกาศ ประกวดราคา

รายการครุภัณฑ์ที่มีความเสี่ยง ควรเร่งรัดดำเนินงาน ดังนี้



ลำดับ	รายการ	หน่วยบริการ (รับจัดสรร)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน	จัดสรรปี 2568	ความก้าวหน้า 5 มี.ค. 68	ความเสี่ยง
	สสจ.น่าน นำนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						
1	เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์	รพ.แม่จริม	805,000	1	805,000	ยกเลิกประกาศผู้ชนะรอบที่ 1 เนื่องจากมีการอุทธรณ์ และ คก.พิจารณาผลใหม่ ***ต้องเร่งรัด เนื่องจากยังไม่ขึ้นประกาศจัดซื้อครั้งที่ 2 (ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลา)	**เสียงสูง
	รพช.ดำเนินการ ครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1 สสจ.น่านดำเนินการ)						
2	ตู้อบเด็ก	รพ.เวียงสา	550,000	1	550,000	ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รออุทธรณ์ คาดว่าลงนามสัญญา ภายใน มี.ค.68	
3	เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร	รพ.น่าน้อย	790,000	1	790,000	อยู่ระหว่างเสนอรายงานพิจารณาผลการเสนอราคา (**หากเร่งรัด คาดว่าลงนามสัญญา ภายใน มี.ค.68)	
4	เครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์	รพ.เฉลิมฯ	272,000	1	272,000	ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเนื่องจากการขึ้นโครงการพร้อมกับรายการเครื่องซักผ้า รพ.แม่จริม *ประกาศผู้ชนะใหม่และเรียกผู้ชนะทำสัญญา **คาดว่าลงนามสัญญา ภายใน มี.ค.68	
5	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อบระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล	รพ.เฉลิมฯ	640,000	1	640,000	ขึ้นประกาศเผยแพร่แผนฯ 24/2/2568	**เสียงสูง

รายการสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ควรเร่งรัดดำเนินการ งบลงทุน พรบ.รายจ่าย พ.ศ.2566-2568

ลำดับ	รายการ	หน่วยบริการ (รับจัดสรร)	งบประมาณ	จำนวน	วงเงินตามสัญญา	จัดสรรปี 2568	ก่อนนี้ PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า 5 มี.ค.68
รายการสิ่งก่อสร้าง (ผูกพัน จากปี 2566)									
	สสจ.น่าน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง								
1	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,797 ตารางเมตร (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว) งบผูกพัน ปีงบฯ 2566 = 21,213,800 บาท (งบพับ 14,949,100 บาท ; เบิกจ่ายได้ 2 งวด 6,264,700 บาท) ปีงบฯ 2567 = 0 บาท ปีงบฯ 2568 = 75,426,900 บาท (PO แล้ว)	รพ.ปัว	106,069,000	1	102,700,000	75,426,900	75,426,900	22,799,400	-ความก้าวหน้า 35.46% (ล่าช้ากว่าแผน 14.07%) ส่งมอบงวด 6 จาก 14 งวดงาน - (บริษัท หจก.น่านสุริยะ) สิ้นสุดสัญญา 17 ก.ย.68

สำคัญ	รายการ	หน่วยบริการ (รับจัดสรร)	งบประมาณ	จำนวน	วงเงินตามสัญญา	จัดสรรปี 2568	ก่องนี้ PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า 5 มี.ค.68
	งบสิ่งก่อสร้าง (ผูกพัน จากปี 2567)								
	สสจ.น่าน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง								
1	อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด ผู้ป่วยหนัก และ ผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พท. 5,585 ตร.ม. (ด้านแผ่นดินไหว) ผูกพัน 3 ปี ปี 2568 ; 22,264,000 บาท ปี 2569 ; 124,778,600 บาท	รพ.เวียงสา	172,991,300	1	168,800,000	22,264,000	22,264,000	-	ความก้าวหน้า 1.89% (ล่าช้ากว่าแผน 4.57 %) - ก่อสร้างงวด 1 / 16 งวดงาน ครบสัญญา 13 ก.ย.69
2	อาคารผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาลชุมชน) และอาคารห้องเครื่องระบบไปป์ไลน์ เป็น อาคาร คสล.2 ชั้น พท. 2,696 ตร.ม. (ด้าน แผ่นดินไหว) ผูกพัน 3 ปี ปี 2568 ; 27,773,800 บาท ปี 2569 ; 46,775,800 บาท	รพ.เชียง กลาง	87,705,500	1	66,287,000	27,773,800	27,773,800	7,954,440	ความก้าวหน้า 10.89% (ล่าช้ากว่าแผน 0.71 %) - ก่อสร้างงวด 2 / 8 งวดงาน - ครบสัญญา 6 ธ.ค.68
3	ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว เป็น อาคาร คสล.3 ชั้น พท. 819 ตร.ม. (ด้าน แผ่นดินไหว) ผูกพัน 3 ปี ปี 2568 ; 6,457,400 บาท ปี 2569 ; 6,208,600 บาท	รพ.ภูเพียง	14,901,200	1	14,880,000	6,457,400	6,457,400	-	ความก้าวหน้า 0.20% (ยังไม่เข้างวด 1 / 8 งวดงาน) (ล่าช้ากว่าแผน 42.77%) ***ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน -อยู่ระหว่างเร่งรัดก่อสร้างครั้งที่ 5 ครบ สัญญา 14 ก.ย.68

สำคัญ	รายการ	หน่วยบริการ (รับจัดสรร)	งบประมาณ	จำนวน	วงเงินตามสัญญา	จัดสรรปี 2568	ก่อนนี้ PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า 5 มี.ค.68
	งบสิ่งก่อสร้าง (ผูกพัน จากปี 2567)								
	สสจ.น่าน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง								
4	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. พื้นที่ 3,908 ตร.ม. (ด้าน แผ่นดินไหว) ผูกพัน 4 ปี ปี 2568 ; 14,462,900 บาท ปี 2569 ; 43,388,400 บาท	รพ.บ่อเกลือ	30,822,300	1	28,700,000	13,356,800	13,356,800	-	ความก้าวหน้า 5.11%
สำคัญ	รายการ	หน่วยบริการ (รับจัดสรร)	งบประมาณ	จำนวน	วงเงินตามสัญญา	จัดสรรปี 2568	ก่อนนี้ PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า 5 มี.ค.68
	งบสิ่งก่อสร้าง (ผูกพัน จากปี 2567)								
	รพ.น่าน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง								
6	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พท. 3,908 ตร.ม. (ด้าน แผ่นดินไหว) ผูกพัน 4 ปี ปี 2568 ; 14,462,900 บาท ปี 2569 ; 43,388,400 บาท	รพ.น่าน	72,313,200	1	72,250,000	14,462,900	14,462,900	10,115,000	เบิกจ่ายแล้ว 4 งวดงาน อยู่ระหว่างเตรียมตรวจรับงวดที่ 5 ในวันที่ 10 มี.ค 68
6	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พท. 3,908 ตร.ม. (ด้าน แผ่นดินไหว) ผูกพัน 4 ปี ปี 2568 ; 14,462,900 บาท ปี 2569 ; 43,388,400 บาท	รพ.น่าน	72,313,200	1	72,250,000	14,462,900	14,462,900	10,115,000	เบิกจ่ายแล้ว 4 งวดงาน อยู่ระหว่างเตรียมตรวจรับงวดที่ 5 ในวันที่ 10 มี.ค 68

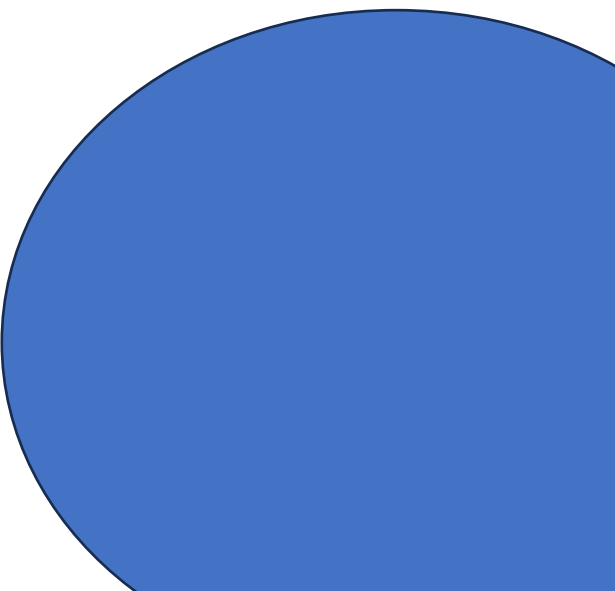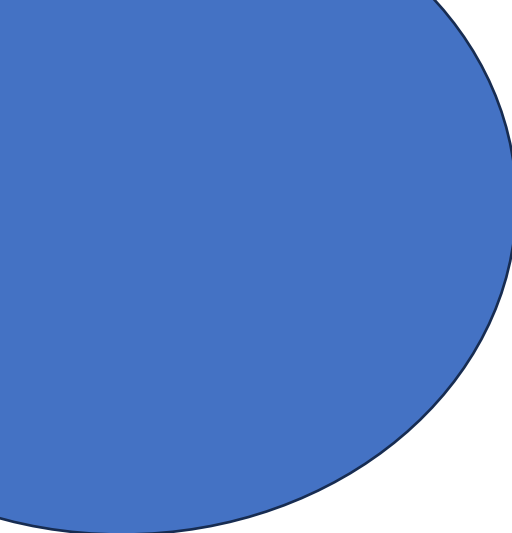

จบการนำเสนอ
